PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - 1 PORTA DE ABRIR OU SEM PORTAS

SUMÁRIO

PLANO DE CORTE
ORÇAMENTO
LISTA DE COMPRAS

Informação do Móvel

Quantidade de Módulos	0

Medidas Finais	mm
Largura do móvel	1800
Altura do movel	2600
Profundidade caixa do móvel com fundo	600

Prateleira	Quantidade
Quantidade Prateleira	1

Distanciador da Porta	mm
Largura	40

Frente para fechamento	mm
Largura	50


Frente Falsa	mm
Altura	2600
Avanço Frente Falsa	60

Cabideiro	qtd
Coloque em quantos vão você vai usar o cabide	1

Tipo de cabide
CABIDE REDONDO 3M

Tipo de suporte cabide
Suporte cabide

PLANTA BAIXA

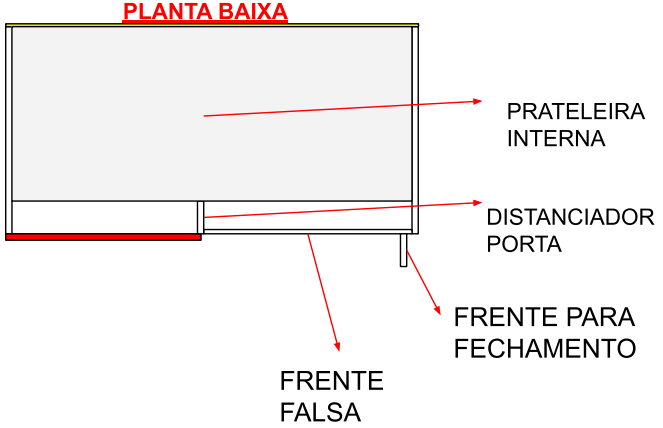

Altura rodapé	100
Altura fechamento superior	100

PORTAS	
COLOQUE 01 SE TEM PORTAS	0

PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - 1 PORTA DE ABRIR OU SEM PORTAS

Plano de corte

SUMÁRIO

PLANO DE CORTE GERAL



Quantidade	Comprimento	Largura	Função	Fita C1	Fita C2	Fita L1	Fita L2	Material
0	1800	600	Base	1800				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	2570	600	Lateral esquerda	2570				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	2570	600	Lateral direita	2570				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	1770	560	Prateleira	1770				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	1800	600	Chapeu	1800	1800			MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	2570	40	Distanciador porta	2570				MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	2600	660	Frente Falsa	2600		660		MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	2600	50	Frente para fechamento		50			MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	1794	2596	Fundo Armário					MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM
0	2394	1134	Porta de Giro	2394	2394	1134	1134	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	1800	100	rodapé					MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0	1800	100	fechamento superior					MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM

Tira das chapas


Profundidade	Quantidade tiras	Material
600	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
560	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
600	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
40	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
660	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
50	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM



PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - 1 PORTA DE ABRIR OU SEM PORTAS

2596	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM
1134	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
100	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
100	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM



Orçamento

SUMÁRIO
ORÇAMENTO GERAL

CUSTO MATERIAL	**R$ 0,00**
CUSTO MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO	**R$ 0,00**
CUSTO MÃO DE OBRA MONTAGEM	**R$ 0,00**
SERVIÇOS AVULSOS	**R$ 0,00**
CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS	**R$ 0,00**
CUSTO TOTAL	**R$ 0,00**

Orçamento por Margem de Lucro		lucro bruto	valor venda
200%	Coloque sua margem de Lucro	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**






Orçamento por Material X (a margem que desejar)		lucro bruto	valor venda
2	Coloque o numero que será multiplicado	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**





Orçamento por metro quadrado		lucro bruto	valor venda
R$ 2.500	Coloque o valor do metro quadrado	**R$ 11.700**	**R$ 11.700**





COMPRAS

SUMÁRIO







PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - 1 PORTA DE ABRIR OU SEM PORTAS

LISTA DE MATERIAL GERAL



LISTA DE COMPRAS TOTAL

LISTA DE MATERIAL GERAL

QTD EXATA	QTDE INTEIRAS	DESCRIÇÃO
0		CANTONEIRA 3 FUROS
0		COLA BRANCA 1KG
0		KIT LIMPEZA PEQUENO+ 1 SILICONE +1 CARTELA
0		PARAFUSO 40 X 4
0		DOBRADIÇA COM AMORTECEDOR CURVA COMERCIAL
0		CABIDE REDONDO 3M
0		Suporte cabide
0		PUXADOR M30 /N31 6MTS PRETO
0	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0,00	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM
0,00	0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM
0,00	AÇO CORTEM 22MM	AÇO CORTEM 22MM
0,00	BRANCO TX 22MM	BRANCO TX 22MM
0	0	PUXADOR BORDA SUTIL /2163 6MTS CHAMPG

ACESSÓRIOS, FERRAGENS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0	CANTONEIRA 3 FUROS	R$ 35,00	R$ 0,00
0	COLA BRANCA 1KG	R$ 40,00	R$ 0,00
0	KIT LIMPEZA PEQUENO+ 1 SILICONE +1 CARTELA	R$ 30,00	R$ 0,00
0	PARAFUSO 40 X 4	R$ 1,00	R$ 0,00
0	DOBRADIÇA COM AMORTECEDOR CURVA COMERCIAL	R$ 30,00	R$ 0,00
0	CABIDE REDONDO 3M	R$ 35,00	R$ 0,00
0	Suporte cabide	R$ 132,65	R$ 0,00
0	PUXADOR M30 /N31 6MTS PRETO	R$ 530,00	R$ 0,00
VALOR TOTAL			**R$ 0,00**

MADEIRAS - MDF

% utilizada da chapa	Descrição	Valor do custo	Chapas inteiras	Valor total chapas inteiras



PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - 1 PORTA DE ABRIR OU SEM PORTAS

0	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM	0,00	0	R$ 0,00
0,00	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X15MM	0,00	0	R$ 0,00
0,00	MDF BRANCO TEXTURIZADO 2FC 275X184X06MM	0,00	0	R$ 0,00
Total custo da chapa utilizada por %		0,00	Total chapa inteira	R$ 0,00

BORDAS

MTS FITA	Descrição	Valor do custo	ROLOS DE BORDA	Valor total BORDAS
0,00	AÇO CORTEM 22MM	0	0	R$ 0,00
0,00	BRANCO TX 22MM	0	0	R$ 0,00
Total metros lineares de borda		0	Total ROLOS DE BORDA	R$ 0,00

PUXADOR DE RÉGUA

BARRAS DE PUXADOR	Descrição	Valor do custo	BARRAS INTEIRAS	Total BARRAS INTEIRAS	TAMPINHA	TOTAL
0	**PUXADOR BORDA SUTIL /2163 6MTS CHAMPG**	R$ 0,00	0	R$ 35,00	0	R$ 0,00
Total metros lineares de puxador		R$ 0,00	Total barras inteiras	R$ 0,00	TOTAL TAMPINHA	R$ 0,00

LACA - FORMICA - LÃMINA NATURA

LACA - FORMICA	Descrição	VT - LACA - FORMICA	LÃMINA NATURAL	Descrição	TOTAL LÃMINA
0	**LACA BRANCA BRILHO**	R$ 0,00	0	LÃMINA NATURAL FREIJÓ	R$ 0,00
Total LACA - FORMICA		R$ 0,00	Total LÃMINA NATURAL	R$ 0,00	

SERVIÇOS AVULSOS

Coloque 01 se você vai usar	**0**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0	**COLAGEM DE FITA E ACABAMENTO - $ POR METRO LINEAR**	**R$ 2,00**	**R$ 0,00**
0	**FIXAÇÃO DE PRATELEIRA**	**R$ 2,00**	**R$ 0,00**
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00



PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - 1 PORTA DE ABRIR OU SEM PORTAS

			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
			R$ 0,00
VALOR TOTAL			R$ 0,00

MÃO DE OBRA FABRICAÇÃO

Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	DIA DO MARCENEIRO + ALMOÇO	250	500
1	DIA DO AJUDANTE + ALMOÇO	120	120
			0
			0
VALOR TOTAL			0

MÃO DE OBRA MONTAGEM

Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIA DO MONTADOR + ALMOÇO	250	250
1	DIA DO AJUDANTE + ALMOÇO	120	120
			0
			0
VALOR TOTAL			0



PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - 1 PORTA DE ABRIR OU SEM PORTAS

CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS

Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FRETE ATÉ 50 KM	100	100
1	1 DIA DE CUSTO FIXO	300	300
			0
			0
VALOR TOTAL			0

PORTAS DE VIDRO

Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALT.	LARG.	M2	VALOR TOTAL
1	PORTA DE ESPELHO PRATA 4MM - PUXADOR 3178T FOSCO LADO INF. - PERFIL 1036 FOSCO - ESQUADRETA 50 2 FUROS COM PELÍCULA	1,00	1,00	1	R$ 1.126,30
1	PORTA REFLECTA PRATA 4MM - PUXADOR 2018 PRETO 120MM - PERFIL 1036 PRETO - ESQUADRETA 50 2 FUROS	1,00	1,00	1	R$ 937,14
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
				0	R$ 0,00
VALOR TOTAL					R$ 0,00

ILUMINAÇÃO

Coloque 01 se você vai usar	0

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0	ORTE E INSTALAÇÃO DE PUXADOR DE BARR		0
			0
			0
			0
VALOR TOTAL			0

MEDIDAS DOS PUXADORES DE PERFIL - JÁ DESCONTANDO AS TAMPINHAS LATERAIS

PLANILHA 4.0 PREMIUM

ARMÁRIO C/ RODAPÉ - 1 PORTA DE ABRIR OU SEM PORTAS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MEDIDA
0	PORTAS DE ABRIR	2394
